



AREA PROYECTOS		CÓDIGO: F-DOSC-AP-101
PROCESO	REPORTES	FECHA DE APROBACIÓN: 14-03-2022
FORMATO	INFORME SEMANAL / MENSUAL	VERSION: 002-2022

### INFORME FINAL

<b>NOMBRE PROYECTO:</b>		<b>OBJETO DEL PROYECTO:</b>	
PROYECTO ACOMETIDA PARA RED REGULADA - CR NOGALES DE LA COLINA		ACOMETIDA RED NORMAL Y REGULADA DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA NUEVA AREA DE ADMINISTRACION CR NOGALES DE LA COLINA	
<b>ACTA INICIO:</b>	21/07/23	<b>DURACIÓN DEL CONTRATO:</b>	15
<b>FECHA INFORME :</b>	31/07/23	<b>ELABORADO POR:</b>	LAURA DUARTE MONROY
<b>CONTRATANTE :</b>	NOGALES DE LA COLINA I ETAPA	<b>NIT:</b>	830.133.786-2
<b>CONTACTO :</b>	JUAN PABLO SENDOYA MEJIA	<b>CARGO</b>	REPRESENTANTE LEGAL
<b>CIUDAD:</b>	BOGOTÁ	<b>DIRECCIÓN PROYECTO:</b>	CRA 58 # 138 - 40
<b>CONTRATISTA:</b>	DOSC STUDIO S.A.S.	<b>NIT:</b>	901.443.574-5
<b>CONTRATO:</b>	DOSC-2204-BOG-106	<b>DIRECCIÓN:</b>	CARRERA 45 # 103-34 OF 208
		<b>TEL:</b>	(601) 3467680
		<b>TEL:</b>	311 8608297

#### 1- ESTADO CONTRACTUAL (Observaciones).

SE HACE FIRMA DEL ACTA DE VECINDAD Y EL ACTA DE RECIBIDO DE ESPACIOS. QUEDA PENDIENTE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

#### 2- RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MATERIAL EN OBRA	
Cargo o Profesión	Cantidad	Detalle	Cantidad
ARQUITECTA LAURA DUARTE	1	Herramienta Menor, EPPs, Planos	1
ARQUITECTO MICHEL CORREA	1	Taladro percutor	1
ING ELECTRICO	1	Herramient menor electruco	1
TECNICO ELECTRICO	2	Equipo Saca nucleos	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		


#### 3- CONTROL DE AVANCE DE OBRA

ÍTEM - CAPITULO	AVANCE %											Programado	Ejecutado	Por Ejecutar	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100				
TENDIDO INFRAESTRUCTURA	Proyectado												100%	100%	0%
	Ejecutado														
CABLEADO ELECTRICO	Proyectado												100%	100%	0%
	Ejecutado														
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS	Proyectado												100%	100%	0%
	Ejecutado														
<b>AVANCE TOTAL</b>												<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	


#### 4- CONTROL PRESUPUESTAL DE OBRA

PROPUESTA CONTRACTUAL													\$ 9.679.048		
ÍTEM - CAPITULO	AVANCE %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Proyectado	Ejecutado	Por Ejecutar	
CONVENCIONES	Proyectado												Total PRO.	\$ 9.679.048	
	Ejecutado												Total EJE.	\$ 9.679.048	
	Por Ejecutar												Total por EJE.	\$ 0	


**5- AVANCE GRAFICO**

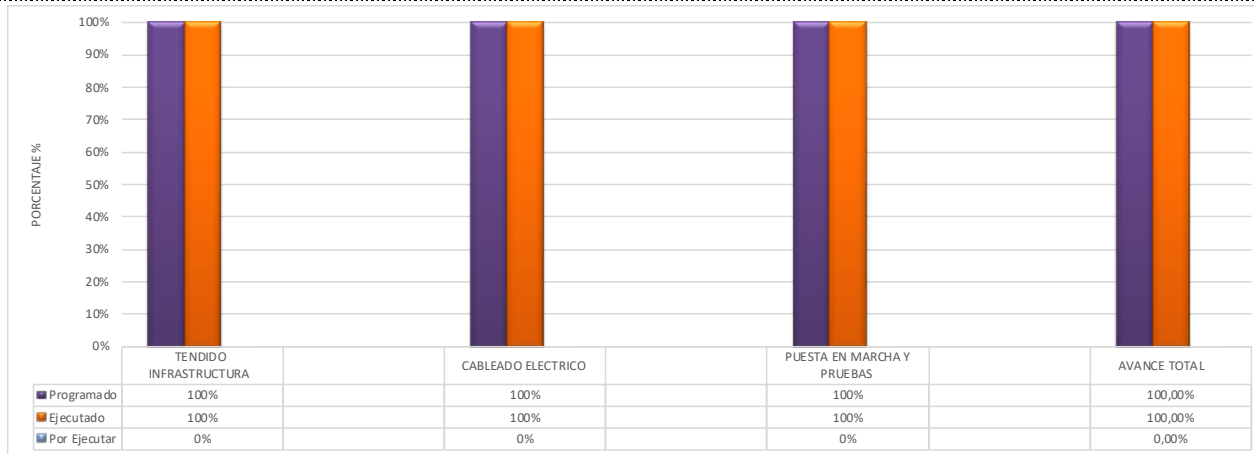

**6- REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo fotográfico)**

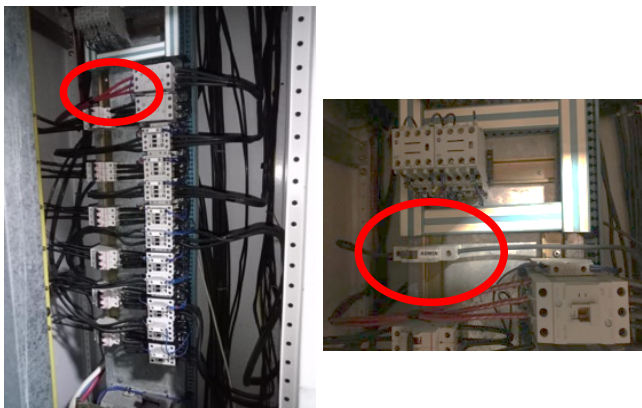


**PUESTA DE PROTECCION EN TABLERO DE SUBESTACION**

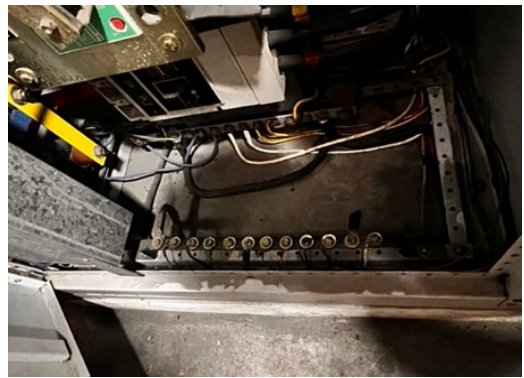

**FASE NEUTRO Y TIERRA en cable # 8**



**TENDIDO DE INFRAESTRUCTURA 1" 1/2 EMT TRAMO 1 Y 2**

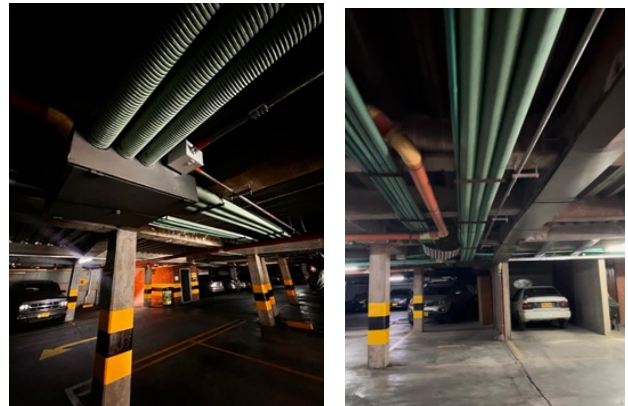


**TENDIDO DE INFRAESTRUCTURA 1" TRAMOS 3-4 Y 5**




INFRAESTRUCTURA CONEXIÓN CON CUARTO IT EN AREA DE ADMINISTRACION



TABLEROS-PROTECCIONES LLAVE BY PASS Y CONECTORIZACION RED REGULADA



PERFORES EN PLACA Y MUROS

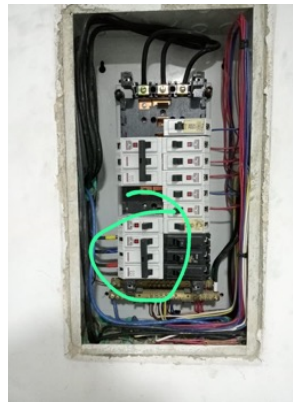

ACOMETICA RED NORMAL 3F # 6-1N # 6 - 1T#8

7- ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DUARANTE EL PERIODO (Descripción)	
Se realizo acometida red regulada y red normal , dentro de los parametros previstos , se deja funcionando y activo.	
8- OBSERVACIONES GENERALES :	
Se realizaron todos los ruidos fuertes durante el periodo acordado de 9am a 12 pm	
<b>ELABORO:</b>	<b>APROBO:</b>
ARQ. LAURA DUARTE <b>ARQUITECTA</b>	Nombre: JUAN PABLO SANDOYA <b>REPRESENTANTE LEGAL DE NOGALES DE LA COLINA</b>
<b>REVISO:</b>	<b>REVISO:</b>
ARQ. MICHEL CORREA <b>GERENTE DE PROYECTOS DOSC STUDIO S.A.S.</b>	Nombre: MARIO RAMIREZ SANTANA <b>PRESIDENTE DE CONSEJO ADMINISTRATIVO</b>
